УИТП ПР №6 Деловая игра «Планирование»

Этап 1. Получите краткое описание проекта на занятии.

Этап 2. Разрешено использовать любой ИИ-ассистент. Сформулируйте запрос и получите черновик проектного предложения. Дата старта проекта – 1 ноября 2026 года. Остальное определяете вы. Сформулируйте уточняющие запросы, если результат полностью вас не устраивает.


> Вы работаете в ИТ-компании, которая занимается реализацией широкого спектра ИТ-проектов (от разработки сайтов до комплексной автоматизации всех бизнес-процессов). Вам поступила краткая заявка от возможного клиента: «описание проекта». Вам необходимо подготовить проектное предложение (концепция). Для этого необходимо структурировать полученную информацию, сформировать цели и задачи, описать продукт, способный решить бизнес-задачи, оценить ресурсы проекта. Дата старта проекта – 01 ноября 2026 года.
>
> Концепция – основа будущего устава проекта, да и всего планирования. Предварительные оценки могут иметь некоторую погрешность, но при этом должны быть близки к реалистичным значениям.
>
> Должны быть отражены следующие пункты:
>
> 1) Название проекта
> 2) Цели и задачи проекта
> 3) Результаты проекта, границы проекта
> 4) Предлагаемые технологии (способ реализации проекта)
> 5) Оценочный график проекта (иерархическая структура работ до 2–3 уровня декомпозиции с привязкой к датам)
> 6) Оценочные ресурсы проекта: трудозатраты (по этапам и штатным единицам), программное обеспечение, оборудование
> 7) Оценочная стоимость проекта

Этап 3. Проектное предложение будет основой для детального планирования работ и расписания. Базовое расписание может быть наиболее наглядно представлено диаграммой Ганта.


Воспользуйтесь приложением ganttpro.com (предоставляется бесплатный период работы).

Шаг 1. Проведите детальную декомпозицию пакетов работ из концепции. Выделите не менее 20 операций. Получившуюся ИСР используйте для ввода работ в GanttPRO.


Введите этапы (при необходимости делайте больше уровней вложенности), работы и вехи проекта (контрольная точка, значимый, ключевой момент, например, при переходе на новую стадию).

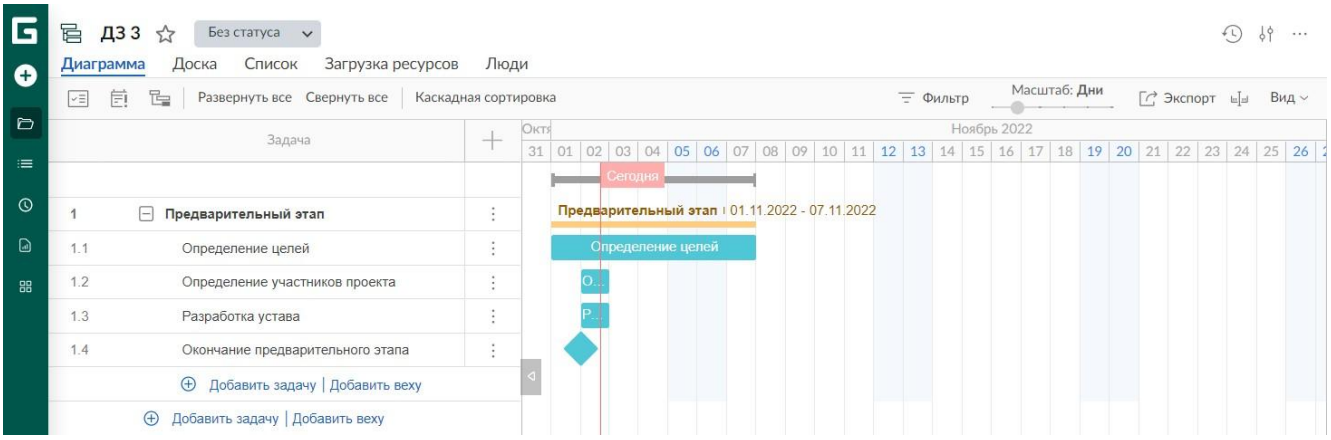


Шаг 2. Определите длительность выполнения работ и связи между ними (FS, SS, FF, SF). Используйте единицу планирования - дни.

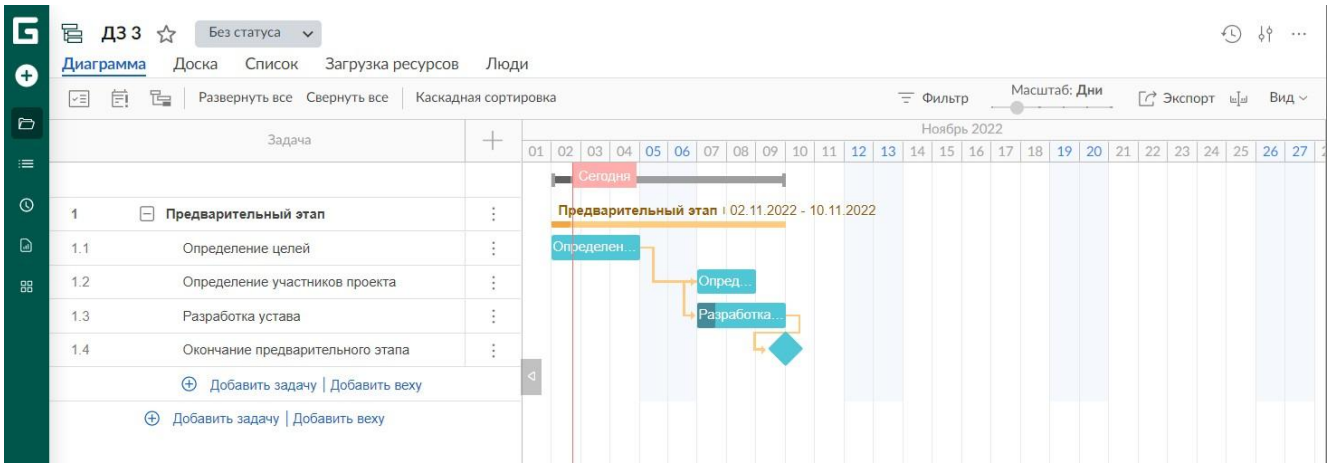


Шаг 3. Выделите все ресурсы (человеческие, материальные), необходимые вам для выполнения проекта. Определите их стоимость.

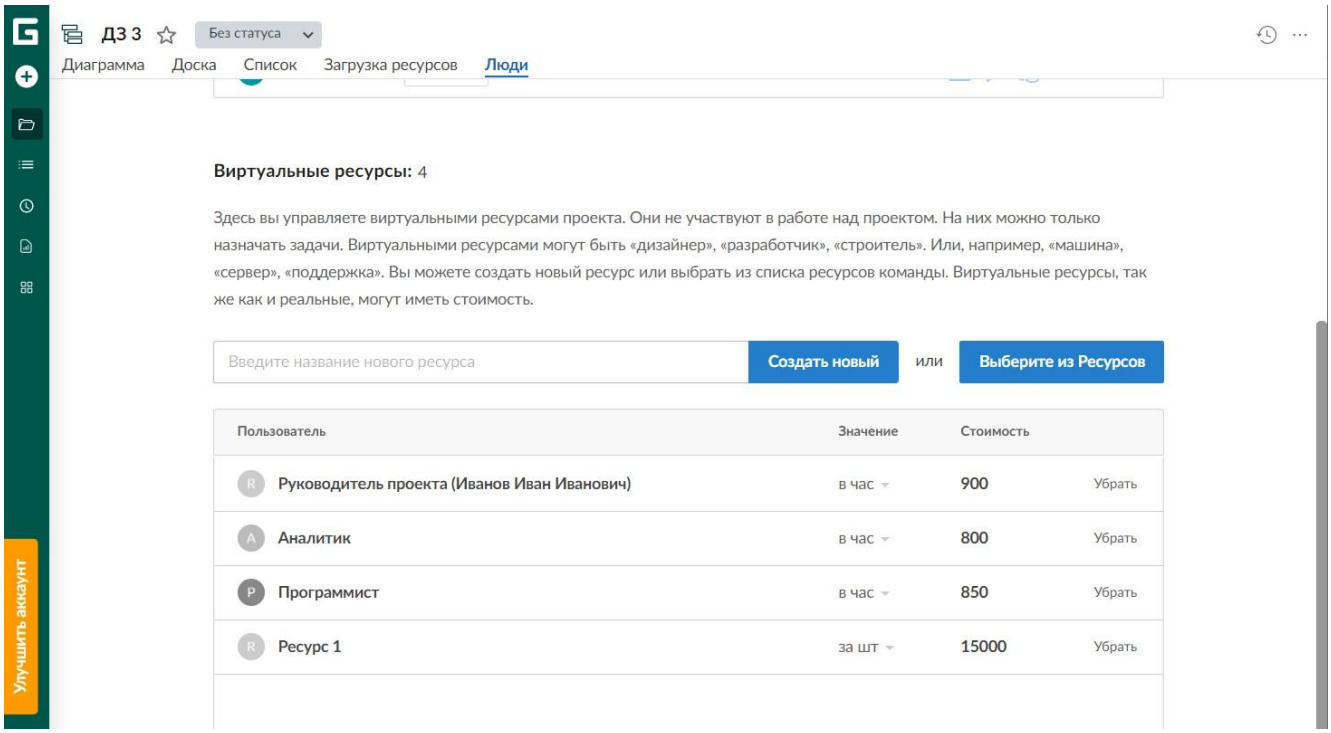

Шаг 4. Распределите ресурсы по работам. Определите время работы сотрудников.

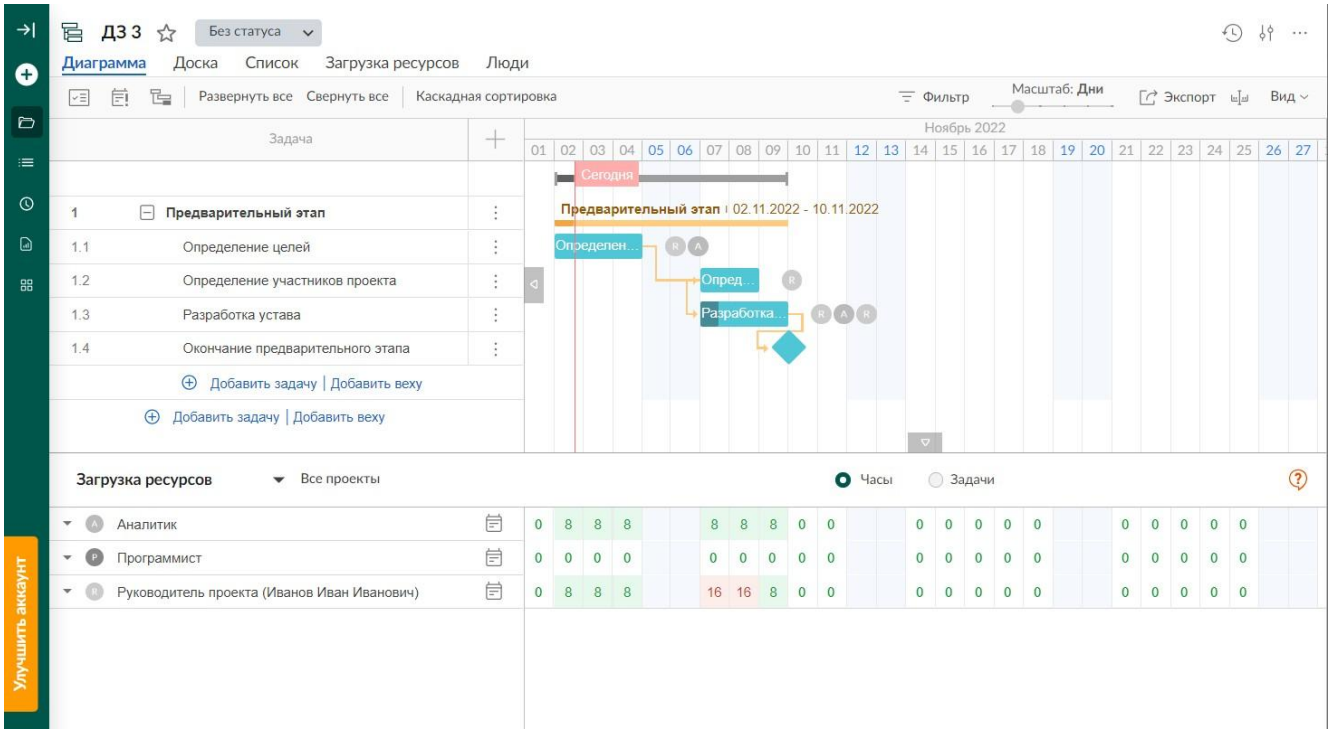

Шаг 5. Проведите корректировку расписания \ ресурсов при наличии перегрузки ресурсов.

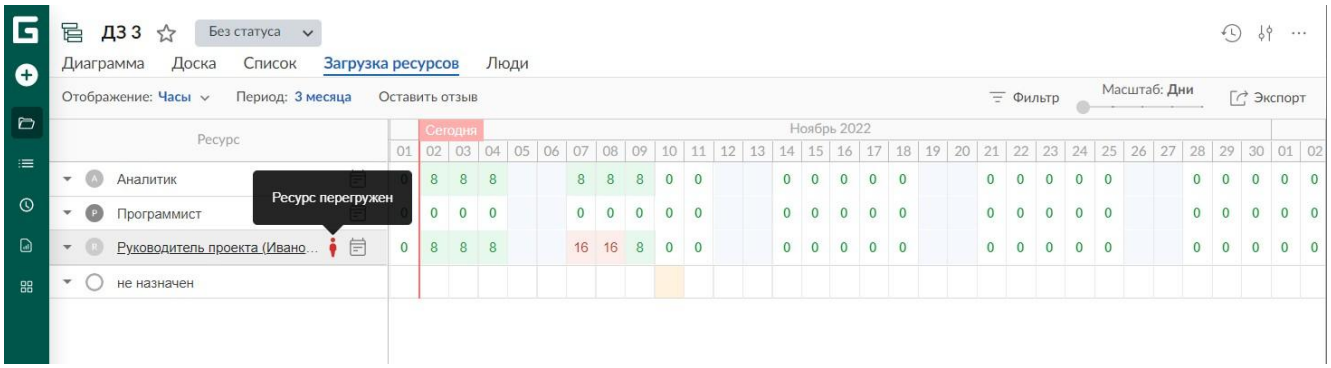

Шаг 6. Сделайте экспорт в PDF с демонстрацией критического пути, загрузки ресурсов. Отображайте: исполнителя, начало, завершение, длительность, трудозатраты, стоимость.
